Ændringer til Internal Report No: VA2


09.02.1970

RC0843



Placering af RC nr.
Nederste hulpe linie

STIK: ELCO 7022-041

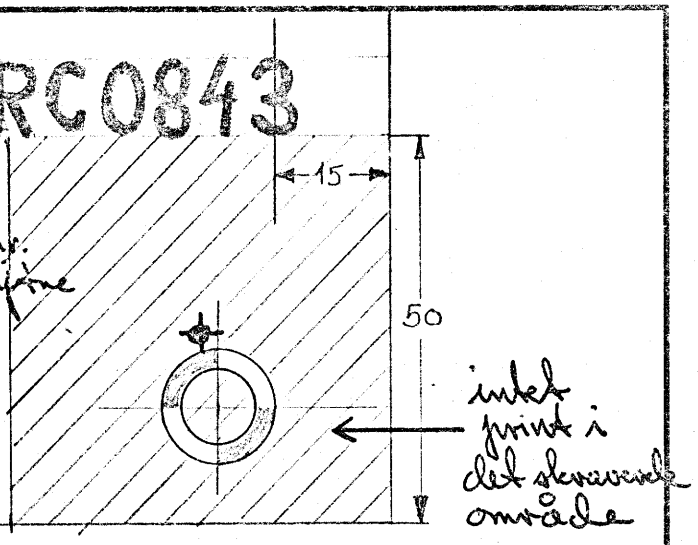


Ændring af printudlæg for RCLM 400

1. Testpunkter flyttes 15mm. længere ind på kortet, således at der nu bliver 30m.m. fra bagkanten til testpunktet.

2. Alle ledere der føres til testpunkter skal have forbindelse med testpunktet på printsiden.

3. Markeringen af testpunkterne sker på komponentsiden således at bogstaverne A, B, C, ... står retvendt og ligge til venstre for testpunkterne, når kortet er orienteret med stikben iv. 1. opad.



Printer må ikke komme længere ind 10 mm. fra pladekant.

Unit:	Designed		Drawing No
			Drawn by
	Approved		Checked
A/S REGNECENTRALEN	Checked		____ Sheets / Sheet ____
	Last Revision		


Form. 304.250.6.66

RC doc: VB 139

A/S REGNECENTRALEN	Designed by	Drawn by	Dwg. Office Check	Design Check	Replaces Dwg. No.	due to ECN	Replaced by Dwg. No.


Dwg. No.

Unit

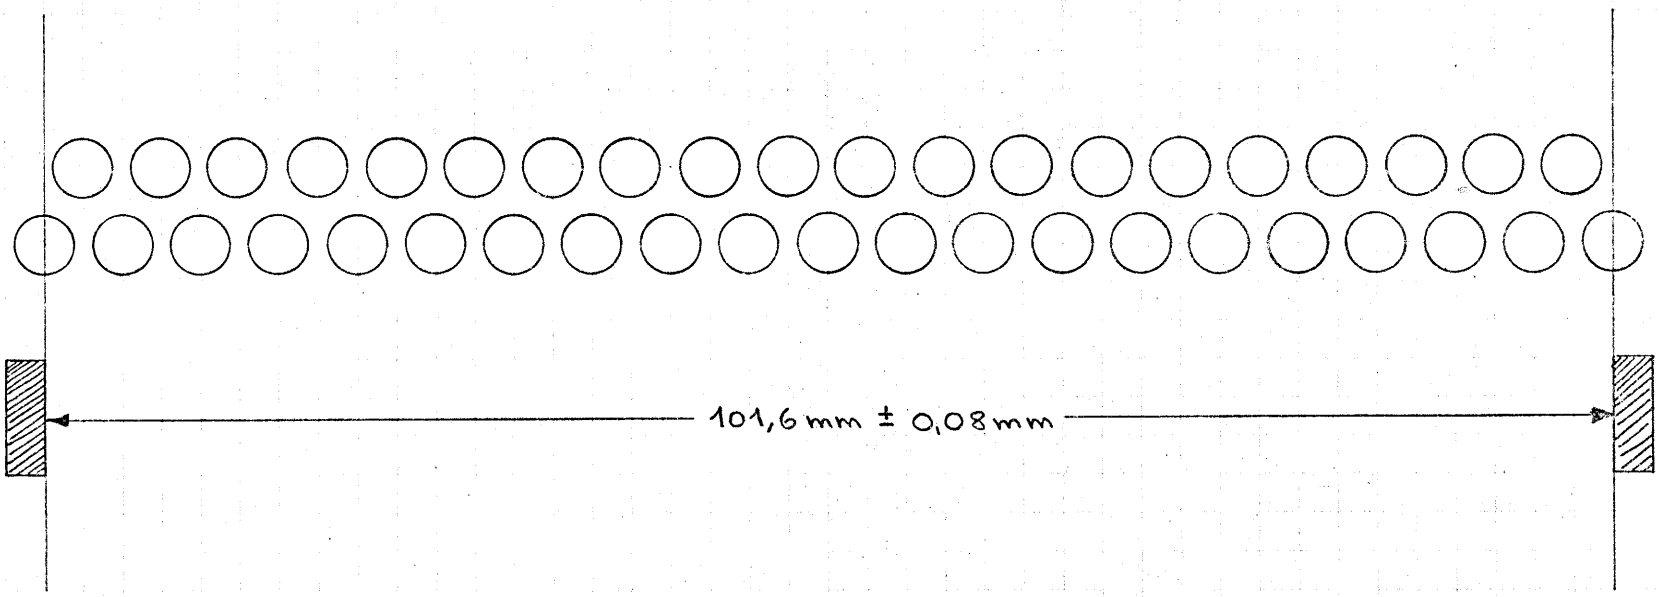

AGF 1574


% REGNECENTRALEN	Emne: I.C. RCLM.400	Opg. nr.:	23/5 1966	Sign. H.C.	Side

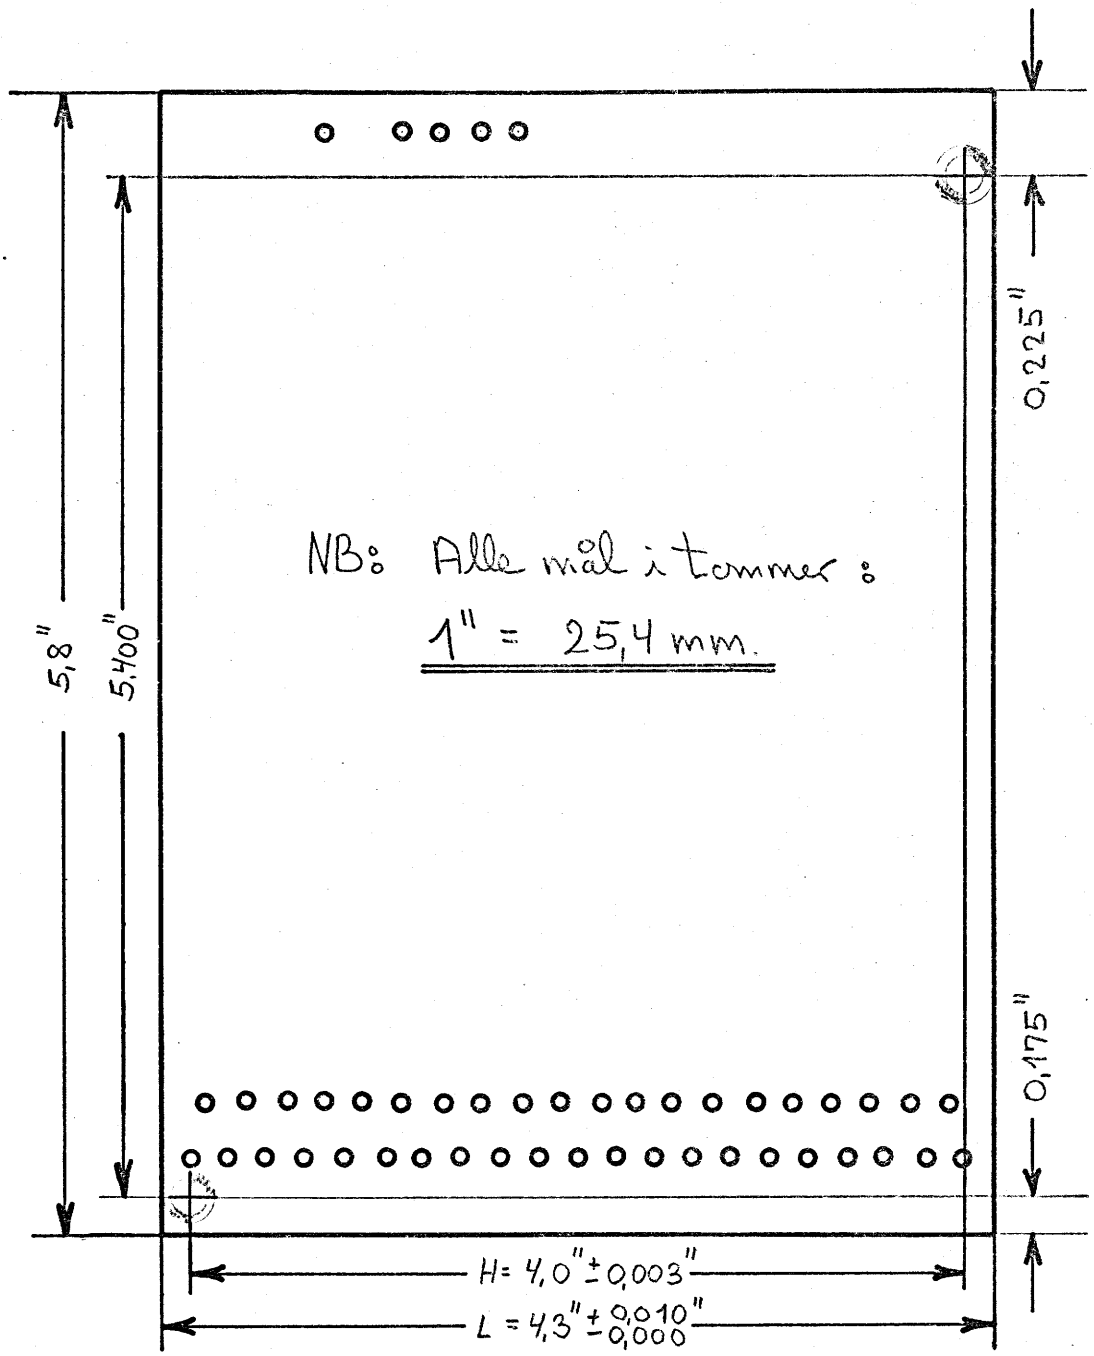

NB: Alle mål i tommer:

1" = 25,4 mm.

4,0" = 101,6 ± 0,08 mm.

		lager nr.	min. lager	
 TC-562-187	BRADY	14317	25 kort	
 TC-375-094		14409	15 kort	
 TC-200-080		14319	10 kort	
 CSR 200		14314	10 rl.	
 CSR 100		14315	10 rl.	
 TPCC-821	CHART - PAK	14215	10 rl.	
 TPCC-82		14206	10 rl.	
 TPTV-34		14212	5 rl.	
 TPTV-690		14216	10 rl.	
 TPTE-159		14208	5 rl.	
 TPTE-169		14408	5 rl.	
 TPE-62		14310	5 rl.	
 TPE-106		14309	5 rl.	

Unit:	Designed 22-5-68 HC	TAPE - OVERSIGT	Drawing No
A/S BRONE CENTRALEN	Approved		Drawn by
	Checked		Checked
	Last Revision 19.6.68. HC		Sheets / Sheet

Form. 308-A4-2-2
